

Дефектный акт № 21

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Морозов Ю.А.

заместитель председателя комиссии:

Сенчук А.М.

заведующий отделом ОЗиО

Карапетян И.В.

секретарь комиссии:

ведущий инженер отдела ЭЗиО

члены комиссии:

Василевский В.П.

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Галушко Н.Н.

заведующий диспетчерским отделом

Дашкевич Ю.В.

заведующий отделом ОЭОиЛ

Крышевич А.Н.

инженер отдела ЭЗиО

Хайруллин Д.М.

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Чеботаренко Д.В.

заведующий отделом ОТиСО

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния оборудования, установленного в ИТП-1 на цокольном этаже, выявлено, что во время работы регулятора перепада давления прямого действия РПД-100-0,6, перепад давления колеблется в недопустимых пределах. Регулятор РПД-100-0,6 был установлен в ИТП-1 в 2005г. Срок службы регулятора – 10 лет.

Выводы комиссии: регулятор перепада давления прямого действия РПД-100-0,6 ремонту не подлежит, требуется замена.

Председатель комиссии

Ю.А.Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.М.Сенчук

Секретарь комиссии

И.В.Карапетян

Члены комиссии:

В.П.Василевский


Н.Н.Галушко

Ю.В.Дашкевич

А.Н. Крышевич

Д.М. Хайруллин

Д.В.Чеботаренко

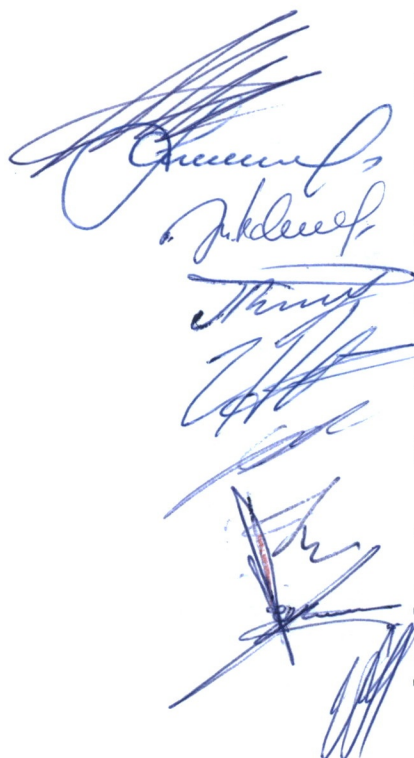

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 202 г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Замена регулятора перепада давления прямого действия РПД-100-0,6: 1. Регулятор РПД-100-0,6	ед.	1	-

Составил: Ведущий инженер
(должность)


(подпись)

Т.Ю.Медвецкая
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 202 г.
